

令和7年12月4日


諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課


- 9月市議会定例会社会文教委員協議会（9月9日）以降の経過について
 - ・ 9月24日より、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）の現場着手。
 - ・ 9月29日に、文化センター執務室を公民館本館へ移転。
 - ・ 10月1日に、ベーゼンドルファーを博物館へ移動。
 - ・ 10月3日に、クラウドファンディングを開始（～12月31日）。
 - ・ 10月10日に、反響板を旧公設市場へ移動。
 - ・ 11月10日に、第7回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催。
 - ・ 11月13日に、文化庁の技術指導を受ける。
 - ・ 11月25日に、電気設備工事及び機械設備工事にかかる債務負担行為設定の補正予算議案を上程、議決。
- 工事の進捗について ＜次ページ写真参照＞
 - ・ 建築主体工事
 - 現時点終了：仮囲い、屋外構造物撤去、外部足場組み、ルーバー撤去、客席撤去・舞台床解体＜写真＞、集会室内装解体＜写真＞、アスベスト撤去 等
 - 今後の工程：建具・外装既存調査、建具製作、耐震補強工事、ホール天井解体 等
- 今後の予定について
 - ・ 12月上旬に、電気設備工事及び機械設備工事の公告予定。
 - ・ 1月上旬に、電気設備工事及び機械設備工事の入札予定。
 - ・ 1月中旬に、電気設備工事及び機械設備工事の仮契約締結予定。
 - ・ 1月頃に、第8回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催予定。
 - ・ 3月議会に、電気設備工事及び機械設備工事の本契約の議案を提出予定。
 - ・ 議決後、本契約締結、4月より工事着手の予定。
 - ・ 今年度内に、工事現場の見学会を実施予定。
- その他
 - ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める

令和7年12月4日

■ 現場写真（11月25日撮影）

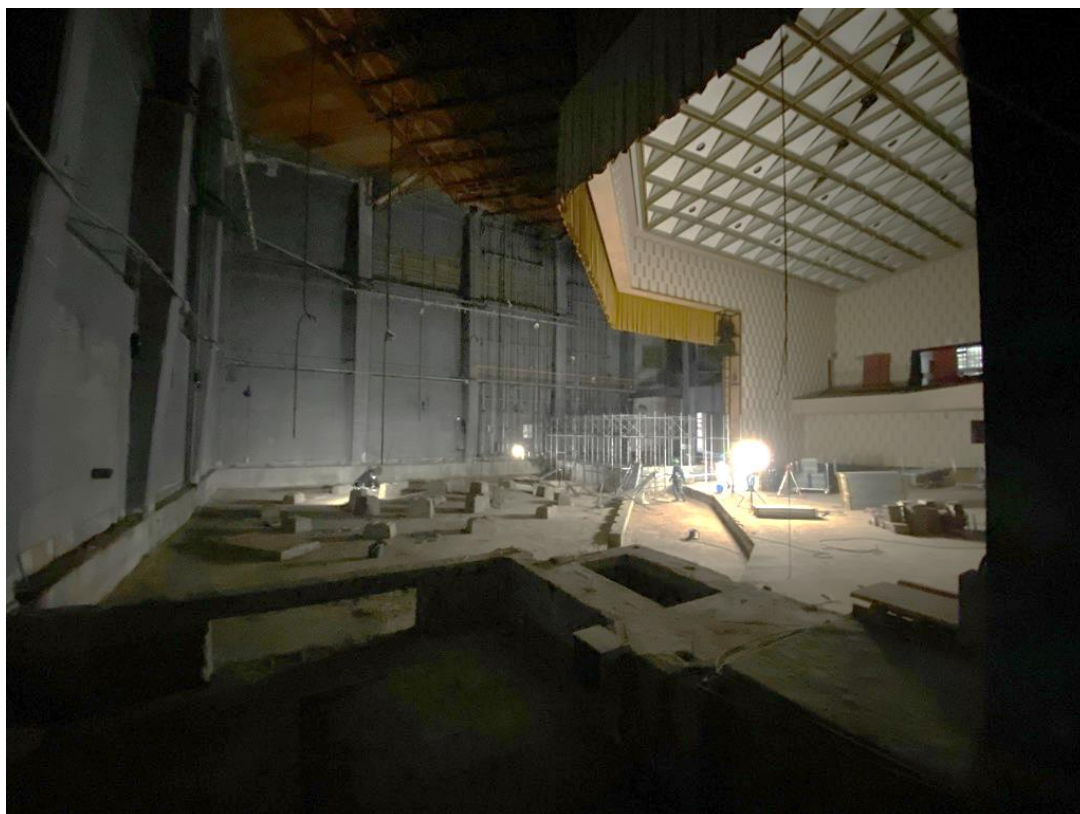

ホール 客席撤去・舞台床解体

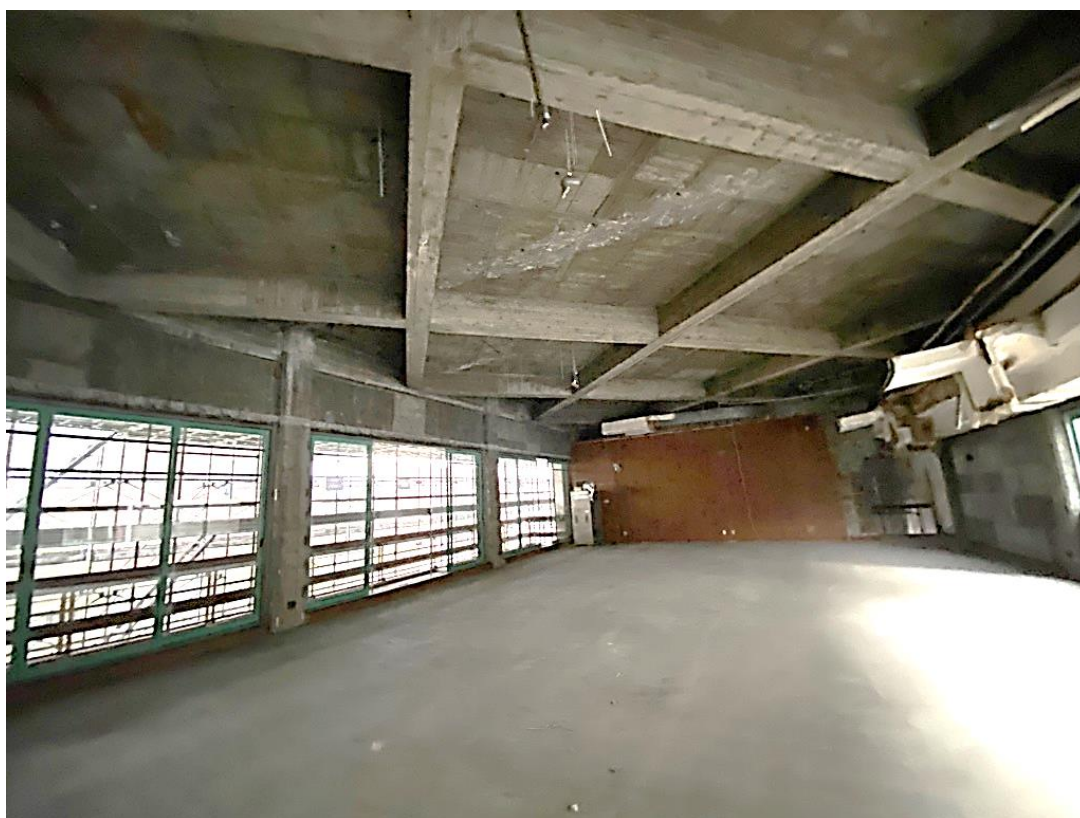

第2集会室 内装解体
